0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Afstand boring t.o.v. Zichtlijn (m.)

Uittredepunt	berm		duiker	berm		inrit weiland		berm	Intredepunt	
0.0	-0.7	-1.4	-2.1	-2.8	-3.2	-3.3	-3.3	-3.1	-2.7	-2.0	-1.4	-0.7	0.0	Afstand boring t.o.v. Maaiveld (m.)
24.7	23.1	21.2	19.3	17.4	15.4	13.4	11.4	9.4	7.5	5.6	3.7	1.9	0.0	Afstand t.o.v. Intredepunt (m.)

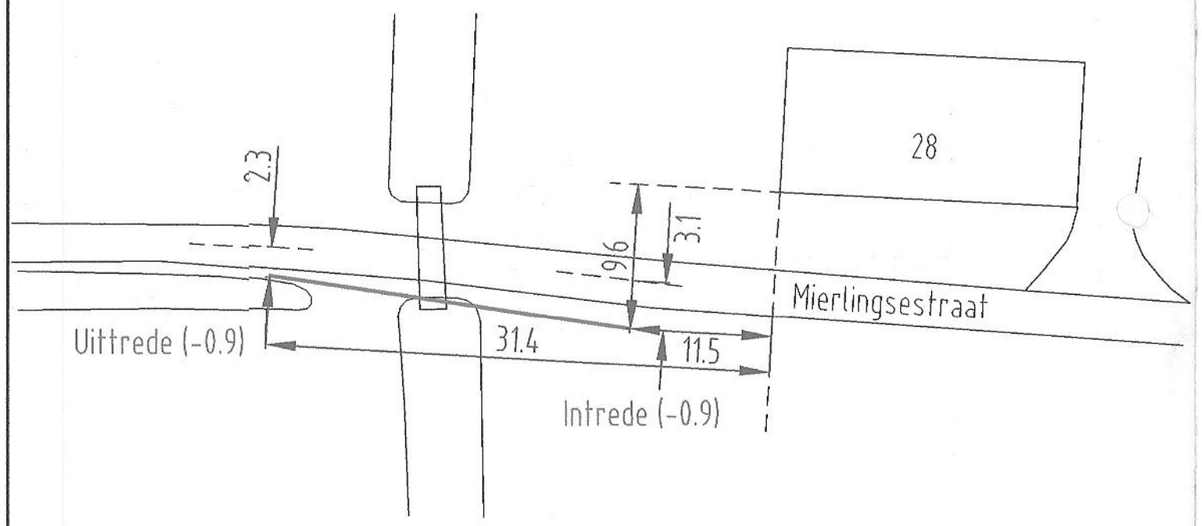

SOLO-Boring : 1 x ϕ 63 HPE

Opmerkingen:

LET OP: Bovenstaande meetgegevens zijn bepaald tijdens de pilotboring.
Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Storende elementen zoals damwanden, betonijzer, spoorrails,
bodemgesteldheid en dergelijke, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Opdrachtgever:	Gebr. van Mouwrik
Projectnr. Opdrachtgever:	
Kenmerk:	Aanleg Persriool
Boring nr.:	
Projectnr. Van de Beek BV:	

Gestuurde Boring
Mierlingsestraat t.h.v. perc. 28
te Erichem

GESTUURD BOREN
KABELS - LEIDINGEN
van de BEEK B.V.
Neerijnen Tel: 0345 - 56 97 98 www.beekgestuurdboren.nl

Discipline:	Gestuurde boring
Status:	Revisie
Uitgevoerd:	09-07-2002
Boormeester:	AvA
Materiaal:	HPE
SDR klasse:	
Lengte mat:	
Lengte boring	25 mtr
Lengte Horiz.	

GBKN / Beheerkaart:

Schaal Dwarsprofiel:	1:200
Schaal Topogr. Overz.:	niet op schaal
Aant. bldn:	1
Formaat:	A3

Getekend:	Datum:	Gecontr:
RZ	11-07-2002	

Wijzigingen:

Datum:	Omschrijving:	Get:	Gec.

Bestandsnaam: **Mierlingsestraat Erichem**
