Boring 1: 1 x ϕ 63 HPE

Uittredepunt	berm							weg							berm	Intredepunt	
0.0	-0.6	-1.2	-1.8	-2.2	-2.7	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2	-1.4	-0.7	0.0	Afstand boring t.o.v. Maaiveld (m.)
31.1	29.2	27.3	25.4	23.4	21.4	19.4	17.4	15.4	13.4	11.4	9.5	7.5	5.6	3.8	1.9	0.0	Afstand t.o.v. Intredepunt (m.)

Boring 3: 1 x ϕ 63 HPE

Uittredepunt	berm/kant weg															Intredepunt	
0.0	-0.7	-1.3	-1.9	-2.3	-2.5	-2.8	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	-2.2	-1.5	-0.7	0.0	Afstand boring t.o.v. Maaiveld (m.)
37.2	35.2	33.3	31.4	29.4	27.4	25.4	23.4	21.4	19.4	17.4	15.4	13.4	11.4	9.4	7.5	5.6	3.7	1.9	0.0	Afstand t.o.v. Intredepunt (m.)

Boring 2: 1 x ϕ 63 HPE

Uittredepunt	boeiingkant	berm						weg					berm	Intredepunt	
0.0	-0.6	-1.4	-2.2	-2.9	-3.2	-3.3	-3.3	-3.2	-3.2	-3.0	-2.7	-2.1	-1.4	-0.7	0.0	Afstand boring t.o.v. Maaiveld (m.)
26.7	25.2	23.3	21.4	19.4	17.4	15.4	13.4	11.4	9.4	7.5	5.6	3.7	1.9	0.0	0.0	Afstand t.o.v. Intredepunt (m.)

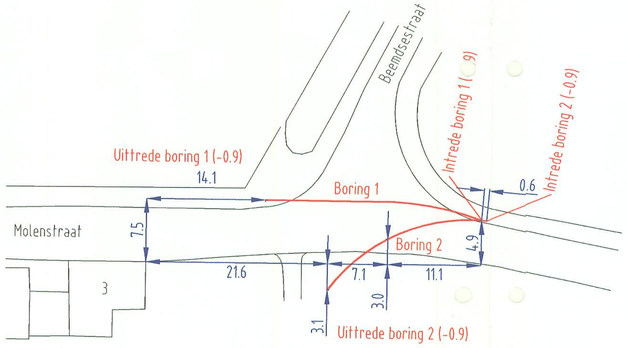

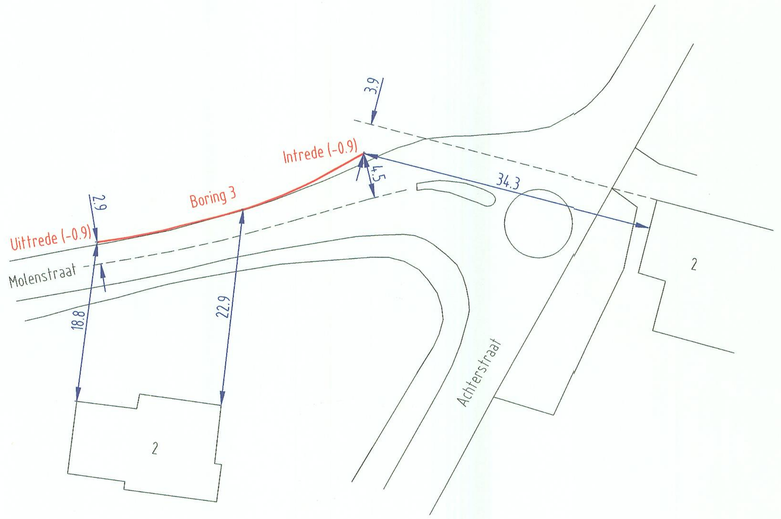

SOL0-Boring : 1 x ϕ63 HPE

Opmerkingen:
LET OP: Bovenstaande meetgegevens zijn bepaald tijdens de pilotboring. Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Storende elementen zoals damwanden, betonijzer, spoorrails, bodemgesteldheid en dergelijke, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Opdrachtgever:	Gebr. van Mouwrik
Projectnr. Opdrachtgever:	
Kenmerk:	Aanleg Perssriool
Boring nr.:	
Projectnr. Van de Beek BV:	

Gestuurde Boring
Molenstraat kruising Beemdsestraat en Achterstraat t.h.v. perc. 2 te Zoelen

Discipline:	Gestuurde boring
Status:	Revisie
Uitgevoerd:	07-06-2002
Boormeester:	AvA/WHD
Materiaal:	HPE
SDR klasse:	
Lengte mat:	
Lengte boring:	31 mtr, 27 mtr en 38 mtr.
Lengte Horiz.	

GBKN / Beheerkaart:

Schaal Dwarsprofiel:	1:200
Schaal Topogr. Overz.:	niet op schaal
Aant. blde:	1
Formaat:	A1

Getekend:	Datum:	Gecontr:
RZ	18-06-2002	

GESTUURD BOREN
KABELS - LEIDINGEN
van de BEEK
www.boringenvandebeek.nl
Neerijen Tel: 0345 - 56 91 98

Wijzigingen:

Datum:	Omschrijving:	Get:	Gec.

Bestandsnaam: **Molenstraat/Beemdsestraat/Achterstraat Zoelen**
