Afwijking bovenaanzicht (m)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

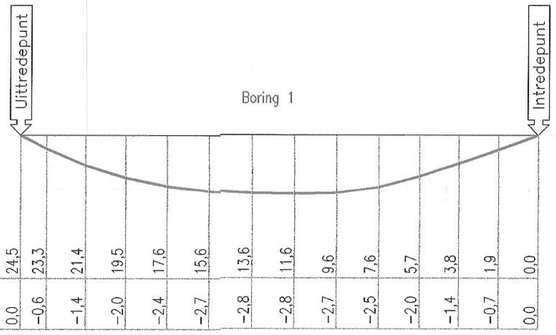

Hor. afstand t.o.v. ITP (m)	24,5	23,3	21,4	19,5	17,6	15,6	13,6	11,6	9,6	7,6	5,7	3,8	1,9	0,0
Hoogte Boring t.o.v. Maaiveld (m)	0,0	-0,6	-1,4	-2,0	-2,4	-2,7	-2,8	-2,8	-2,7	-2,5	-2,0	-1,4	-0,7	0,0

Afwijking bovenaanzicht (m)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

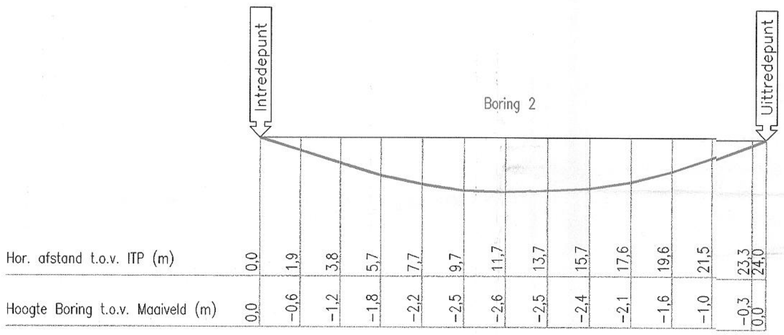

Hor. afstand t.o.v. ITP (m)	0,0	1,9	3,8	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7	15,7	17,6	19,6	21,5	23,3	24,0
Hoogte Boring t.o.v. Maaiveld (m)	0,0	-0,6	-1,2	-1,8	-2,2	-2,5	-2,6	-2,5	-2,4	-2,1	-1,6	-1,0	-0,3	0,0

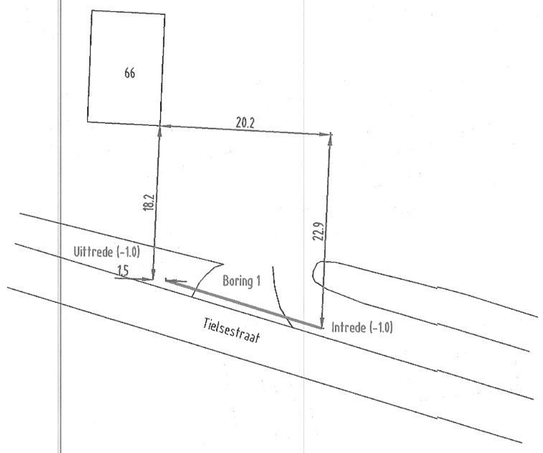

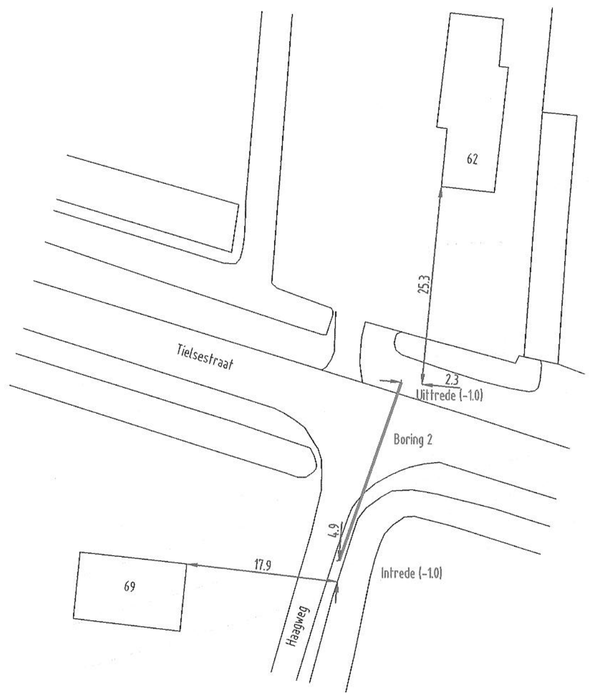

SOLO-Boring : 1 x Ø 63 HPE

Opmerkingen:

LET OP: Bovenstaande meetgegevens zijn bepaald tijdens de pilotboring. Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Storende elementen zoals damwanden, betonijzer, spoorrails, bodemgesteldheid en dergelijke, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Opdrachtgever:	Gebr. van Mouwrik
Projectnr. Odrachtgever:	
Kenmerk:	Aanleg persriool
Vergunning nummer:	
Projectnr. Van de Beek BV:	

Gestuurde Boring
Tielsestraat perc. 66 en kruising Haagweg te Maurik

GESTUURD BOREN
KABELS - LEIDINGEN

Neerijnen Tel: 0345 - 56 97 98 www.vandebeekbedrijven.nl

Discipline:	Gestuurde boring
Status:	Revisie
Uitgevoerd:	02-07-2003
Boormeester:	WHO
Materiaal:	
SDR Klasse:	
Lengte mof:	
Lengte boring:	25 mtr. en 24 mtr.
Lengte horiz:	

GBKN / Beheerkaart:

Schaal Dwarsprofiel:	1:200
Schaal Topogr. Overz.:	niet op schaal
Aant. bldn:	1
Formaat:	A2

Getekend:	Datum:	Gecontr:
RZ	04-07-2003	

Wijzigingen:

Datum:	Omschrijving:	Get:	Gec.

Bestandsnaam: **Tielsestraat Maurik**
